




Point d'avancement du Projet Wash Togo

Plan de présentation



Rappel des activités prévues au trimestre 1

Communication pour le changement

Soft

- ✓ Mettre en place et former les Comités d'Assainissement Villageois/Quartier (CAVQ) ;
- ✓ Suivre les progrès des communautés vers la Fin de Défection à l'Air Libre (FDAL) ;
- ✓ Former et équiper 75 membres des groupements féminins et des Comités Villageois de Développement (CVD) à la promotion d'hygiène en milieu communautaire (hygiénistes)
- ✓ Concevoir et reproduire des boîtes à images ;
- ✓ Réaliser un diagnostic participatif du secteur de l'eau;
- ✓ Accompagner les 03 villages dans l'élaboration ou la révision de leurs Plans d'Action Villageois (PAV)

Hard

Réalisations physiques

- Réaliser un forage de type Pompe à Motricité Humaine (PMH) ;
- Former et équiper 06 maçons pour la réalisation de latrines familiales dans les 03 communautés;
- Construire des latrines dans les familles ;
- Construire une latrine dans les lieux publics

Résultats 1.1

R1.1: 03 communautés de la commune de la Kozah ont mis fin à la Défécation à l'Air Libre (DAL)

- ✓ 03 Communautés ont été déclenchées suivant l'ATPC ;
- ✓ Mise en place de 03 Comités d'Assainissement Villageois/Quartier (CAVQ) composés de 22 Membres dont 10 Femmes dans 03 communautés ;
- ✓ Formation des CAVQ et des Comités Villageois de Développement (CVD)
- ✓ Synopsis des théâtres fora élaborés et répétitions en cours;



Mise en place des CAVQ à Tcharè



Mise en place des CAVQ à Soumdina

Résultats 1.2

R1.2: Au moins 5 000 personnes des 3 villages de la Commune de la Kozah adoptent de bonnes pratiques d'hygiène

- ✓ Identification et concertations avec 26 Femmes responsables de 26 groupements féminins ;
- ✓ Suivi des progrès des ménages : 93 ménages suivis dans les 3 villages ;
- *Forte disparité entre villages : progrès significatifs à Kougbèlkou, mais faible évolution à Tchoou.*
- *Sensibilisation renforcée des ménages sur : la finalisation des latrines, l'installation des dispositifs de lave-mains, l'objectif de Fin de la Défécation à l'Air Libre (FDAL).*
- ✓ Synopsis des théâtres fora élaborés et 12 boîtes à images confectionnées ;

Boîtes à images pour la sensibilisation des communautés




Suivi des progrès d'assainissement à Lassa



Résultats 1.3

R1.3: 3 Communautés sont accompagnées dans l'élaboration ou la révision des PAV

- ✓ Outils de conduite du diagnostic participatif élaborés et paramétrés via Mwater
- ✓ Renforcement de capacités des animateurs et stagiaires;
- ✓ Collecte de données et diagnostic effectués dans les 03 cantons
- ✓ Analyse en cours des Plan d'Action Villageois (PAV) existants

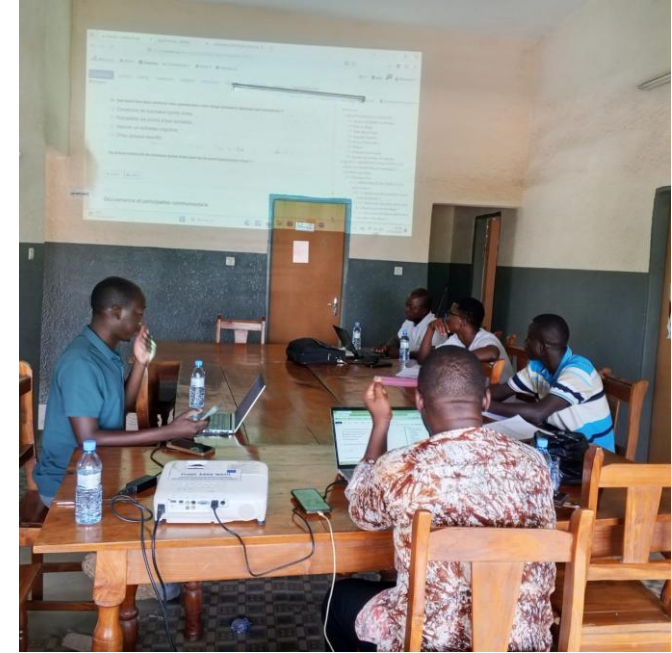

Réunion de cadrage pour le diagnostic participatif



Collecte de données dans un ménage de Soumdina

Résultats 2.1

R1.3: Des infrastructures d'eau potable et d'assainissement sont réalisés au niveau des ménages et des lieux publics

- ✓ Situation de référence réalisée pour la réalisation du forage ;
- ✓ 15 latrines familiales construites avec des dispositifs de lavage des mains (DLM)
- ✓ Diagnostic de sites de réhabilitation de latrines dans les lieux publics;
- ✓ Contractualisation avec les prestataires de travaux et reconnaissance des sites effectuée



Latrine Ecosan construite dans un ménage à Soumdina



Latrine Ecosan construite avec DLM dans un ménage à Lassa

Résultats 2.1

R2.1: Des infrastructures d'eau potable et d'assainissement sont réalisés au niveau des ménages et des lieux publics

- ✓ Formation de 15 maçons locaux à la construction de latrines EcoSan;
- ✓ Dotation et équipement des maçons
- ✓ Accompagnement des ménages à la construction des latrines familiales ;



Formation des maçons locaux à Soumdina



Formation des maçons locaux à Lassa

Difficultés et mesures de contingences

CHALLENGES

- Mobilisation des acteurs communautaires autour de l'approche ATPC
- Emergence de nouveaux besoins liés aux ouvrages publics
- Retard sur le calendrier initial de mise en œuvre du projet

CONTINGENCES

- Priorisation de la sensibilisation et des Visites à domicile
- Orientation vers la réhabilitation de latrines institutionnelles
- Prolongation de la durée de mise en œuvre du projet de 06 mois

Prochains petits pas

Achever et réceptionner les travaux de réalisation du forage équipé de PMH

Achever et réceptionner les travaux de réhabilitations de latrines

Poursuivre la construction de latrines familiales

Mettre en place et former les comités de gestion des ouvrages

Poursuivre les sensibilisations par les émissions radio et les théâtres

Exécution financière

RESSOURCES MOBILISEES

TAUX D'EXECUTION : 62%

- Montant total : 100 000 €
- Montant exécuté: 62 172 €

AVANCES DE FONDS RECUS : 51 200 €

EVI, EVF et Partenaires : 36 200 €


- Eau Vive Internationale
- Eau Vive France
- Eau Vive Pau Pyrénées
- DELABIE
- Rotary Clubs HBS

De l'Eau pour le Sahel

- Contribution annoncée : 30 000 €
- **Montant de la subvention déjà reçu de DEPS : 15 000 €**


Exécution financière

ACTIVITES EN INSTANCE ET RESSOURCES A MOBILISER



Activités en instance

- Renforcement de capacités et réalisation d'ouvrages
 - ❖ Former les acteurs CVD, groupements et CAVQ
 - ❖ Réalisations de latrines familiales
 - ❖ Réaliser les PAV et le suivi FDAL




Ressources à mobiliser

- Montant résiduel à mobiliser : 48 800 €
 - ❖ Appel de fonds : 47 581€
 - ❖ Contribution des bénéficiaires : 1 219€

Exécution financière

RYTHME FUTUR DES DEPENSES

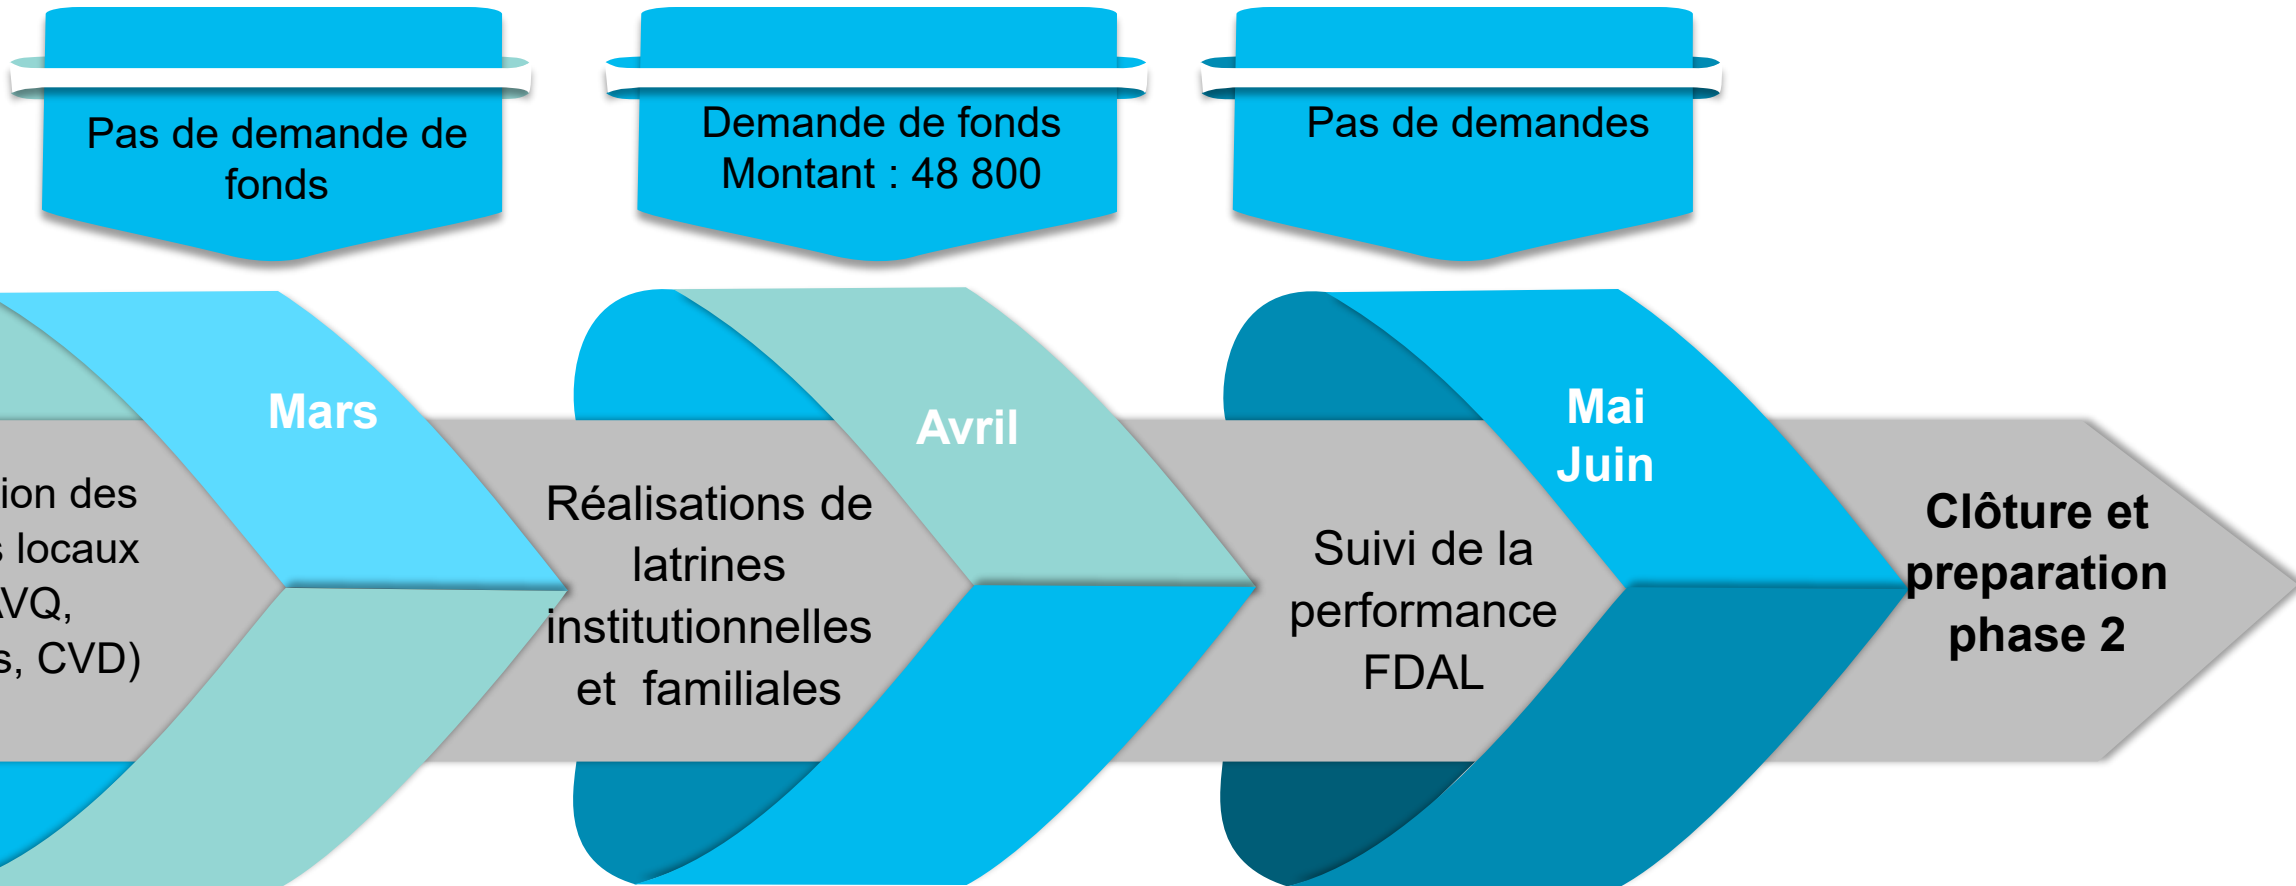



*Merci de votre
aimable attention*
